




令和5年11月29日  
市立伊丹病院・近畿中央病院  
統合委員会【資料①】

# 統合新病院整備工事の 進捗について

< 議題 1 >

# 1) 工事スケジュールについて

- 社会情勢の急激な変化の影響等を受けた建設費の上昇による2度の入札不調
- 令和5年2月15日の入札において落札、2月24日付けで工事請負契約を締結
- 工事請負契約締結後、5月より整備工事に着手
- 令和8年度の統合新病院の開院、令和9年度のグランドオープンを目指す

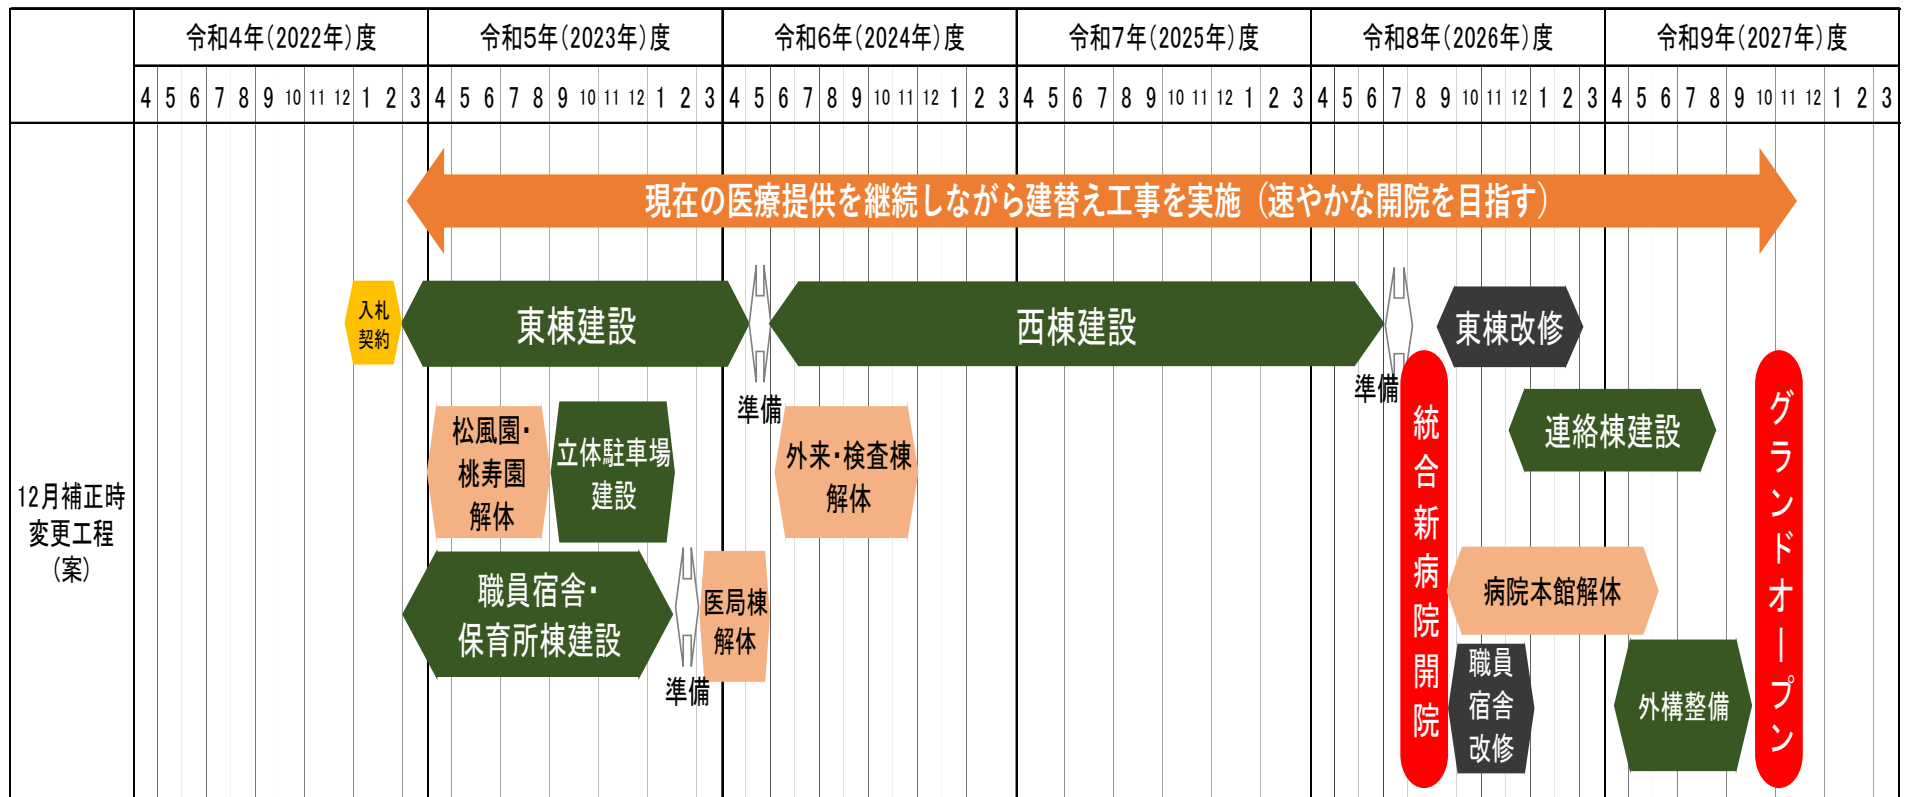

## 2) 工事ステップについて

- 医療提供を継続をしながら、安全確保し病院利用者に配慮して現地建替え工事を進める。
- 現在はステップ2が終了しステップ3に移行。



### 3) 現在の施工状況について

- ①東棟整備工事 I 期 掘削・構台組立・基礎躯体
- ②職員宿舎・保育所棟整備工事 I 期 基礎躯体
- ③松風園・桃寿園解体工事 解体完了
- ④立体駐車場整備工事 11月より着手



写真方向①



写真方向②



写真方向③



航空写真

