

第4回千僧今池の埋め立てと利用計画に関する説明会

# 伊丹市千僧今池埋立造成工事 工事説明

---

発注者：伊丹市 総務部 新庁舎等整備室  
受注者：大成建設株式会社 神戸支店


1. 事業概要（敷地利用計画、スケジュール等）
2. 工事概要（工事工程等）
3. 仮囲い・動線計画
4. 安全対策・環境対策

# 1.事業概要 敷地利用計画（第3回説明会 配布資料抜粋）




# 1.事業概要 完成イメージ図（第3回説明会 配布資料抜粋）

敷地南東からの鳥瞰図となります。

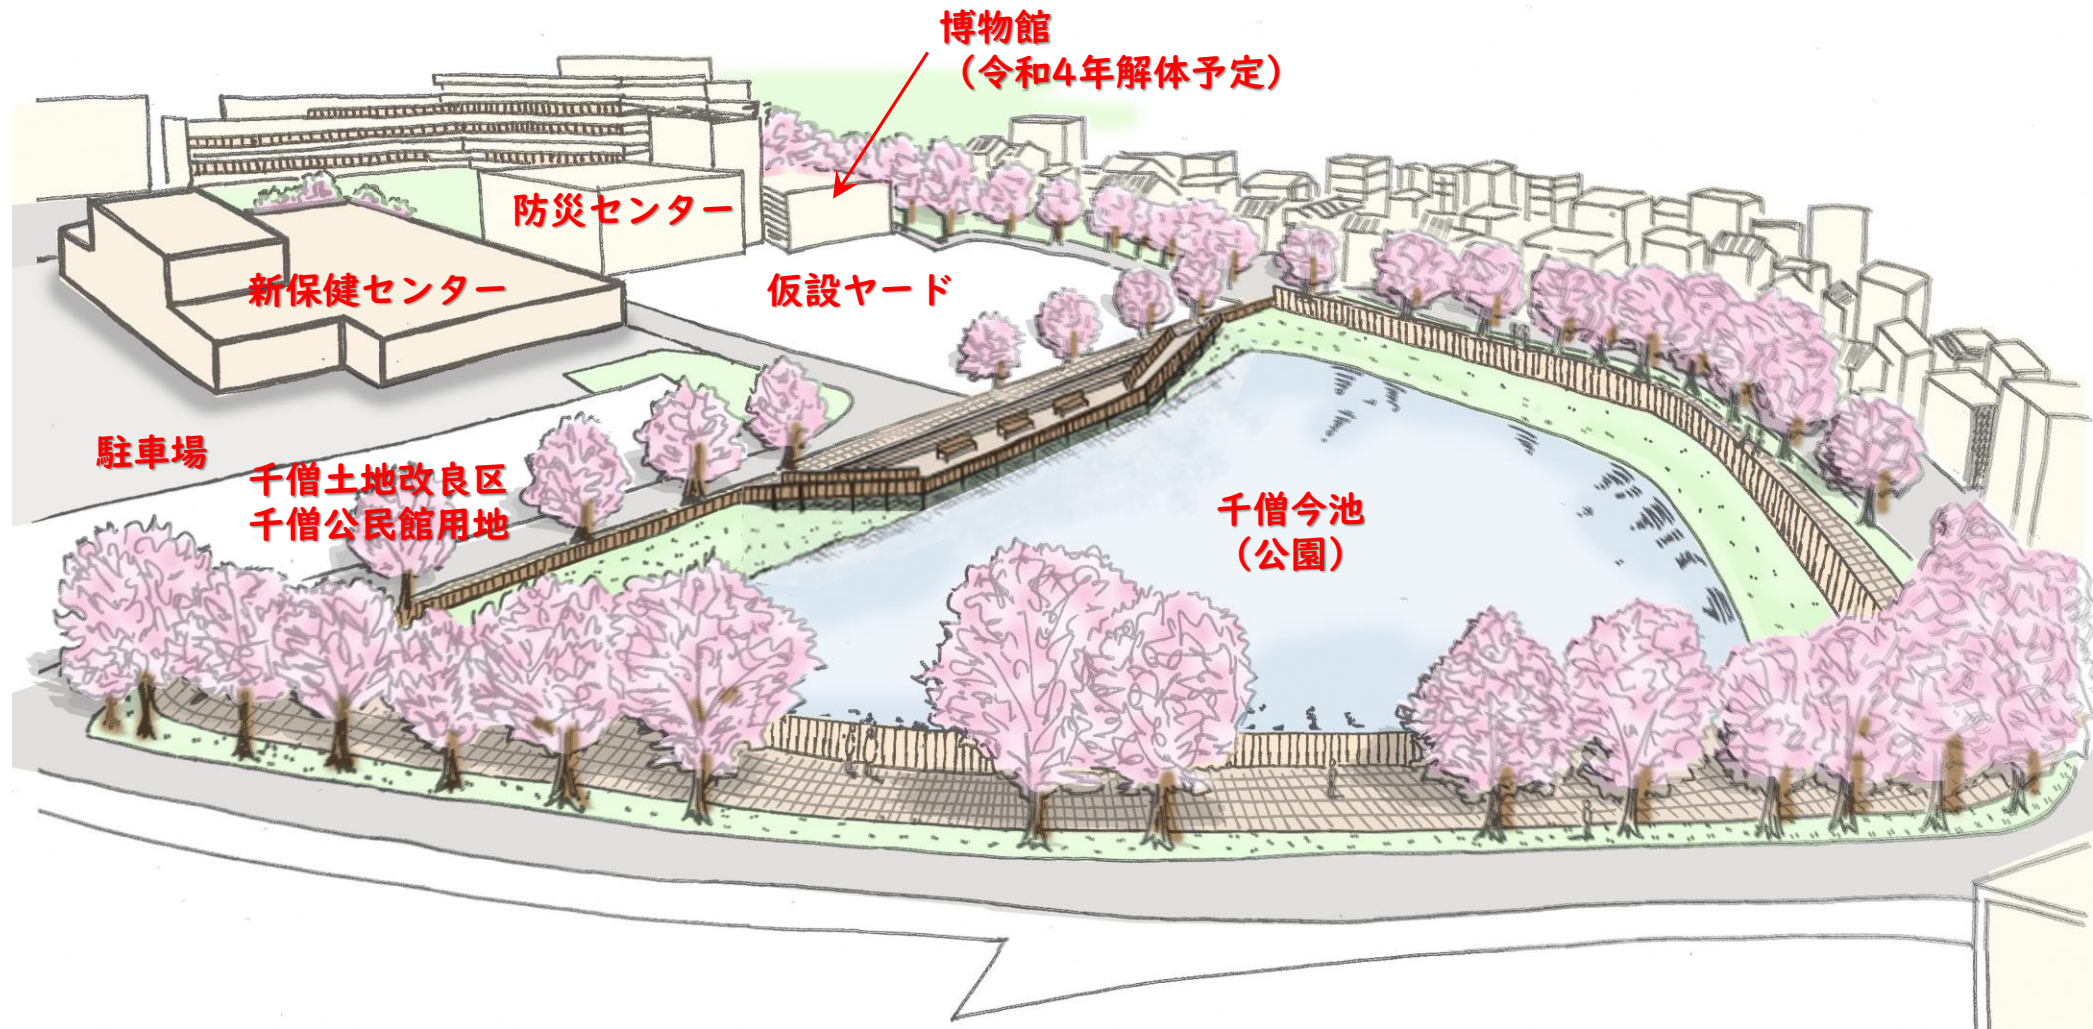

# 1.事業概要 事業スケジュール（第3回説明会 配布資料抜粋）

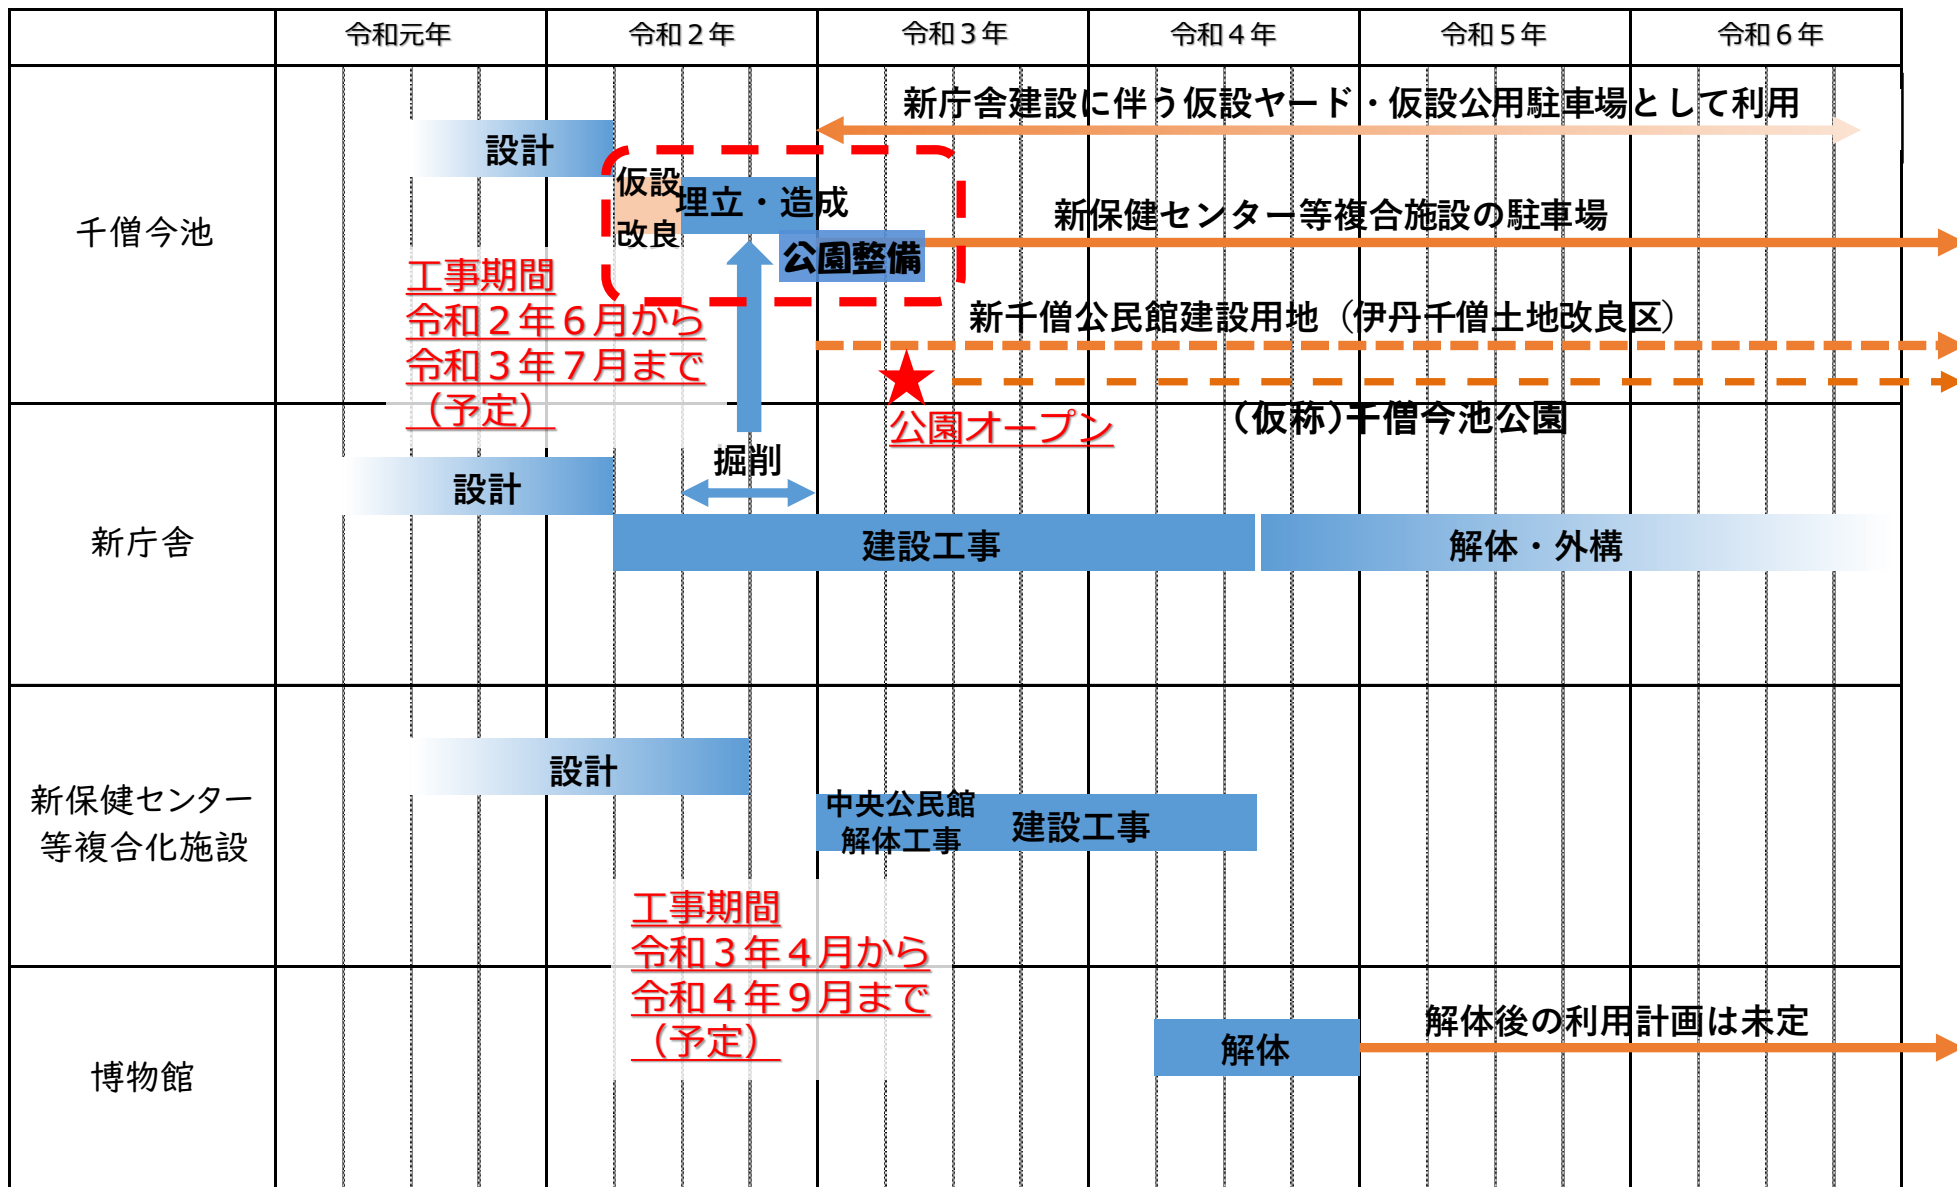

## 2.工事概要

|         |                                                                               |              |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 工 事 名 称 | 伊丹市千僧今池埋立造成工事(伊丹市新庁舎整備工事)                                                     |              |  |
| 工 事 期 間 | 令和2年6月29日～令和3年1月31日                                                           |              |  |
| 工 事 場 所 | 伊丹市千僧一丁目39番1他                                                                 |              |  |
| 発 注 者   | 伊丹市(伊丹市総務部新庁舎等整備室)                                                            |              |  |
| 受 注 者   | 大成建設(株)神戸支店                                                                   |              |  |
| 作 業 時 間 | 8:00～17:00(準備・片付けを除く)<br>大型資材の搬入や、道路使用での行政指示、品質管理上影響のある工事は、時間を超えて作業することがあります。 |              |  |
|         | 作業休日は原則として日曜、祝日、隔週土曜、お盆、年末年始を予定しています。                                         |              |  |
| 問 合 せ 先 | 伊丹市総務部新庁舎等整備室                                                                 | 072-784-8120 |  |
|         | 大成建設(株)伊丹市新庁舎整備工事作業所                                                          | 072-764-7991 |  |

## 2.工事概要 工事工程表


| 年<br>月<br>延月 |         | 2020年  |                   |             |                    |        |                   | 2021年               |
|--------------|---------|--------|-------------------|-------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|
|              |         | 7月     | 8月                | 9月          | 10月                | 11月    | 12月               | 1月                  |
|              |         | 1      | 2                 | 3           | 4                  | 5      | 6                 | 7                   |
| 主 要 事 項      |         | ▼近隣説明会 | ▼工事着工<br>(7/17予定) |             | ▼埋戻し開始             |        |                   | ▼完成検査<br>竣工         |
| 準備・仮設        | 準備・仮設   |        | 仮囲い組立             |             |                    |        |                   | 仮囲い解体               |
|              | 区域外工事   |        |                   |             |                    |        |                   | 管渠工                 |
|              | 配管・舗装工事 |        |                   |             |                    |        | 圧送管・排水側溝・アスファルト舗装 |                     |
|              | 埋戻し工事   |        |                   |             | 埋戻し                |        |                   |                     |
|              | ヘドロ改良工事 |        |                   | ヘドロ改良       |                    |        |                   |                     |
|              | 撤去工事    |        | 植栽帯撤去             |             | 張りブロック撤去           |        |                   |                     |
|              | 安全・環境   |        |                   |             |                    |        |                   | 通行止め(5日間予定)<br>通行規制 |
| 安全・環境        | 車両      |        |                   | 大型車両 5台/日予定 | 大型ダンプ車両 最大100台/日予定 |        |                   |                     |
|              | 粉塵      |        |                   | 粉塵・臭気発生作業   |                    | 粉塵発生作業 |                   |                     |
|              | 騒音      |        | 騒音発生作業            |             | 騒音発生作業             |        |                   |                     |

伊丹市千僧今池埋立造成工事 工程表(案)

### 3.仮囲い・動線計画 車両動線



### 3.仮囲い・動線計画 歩行者・自転車動線

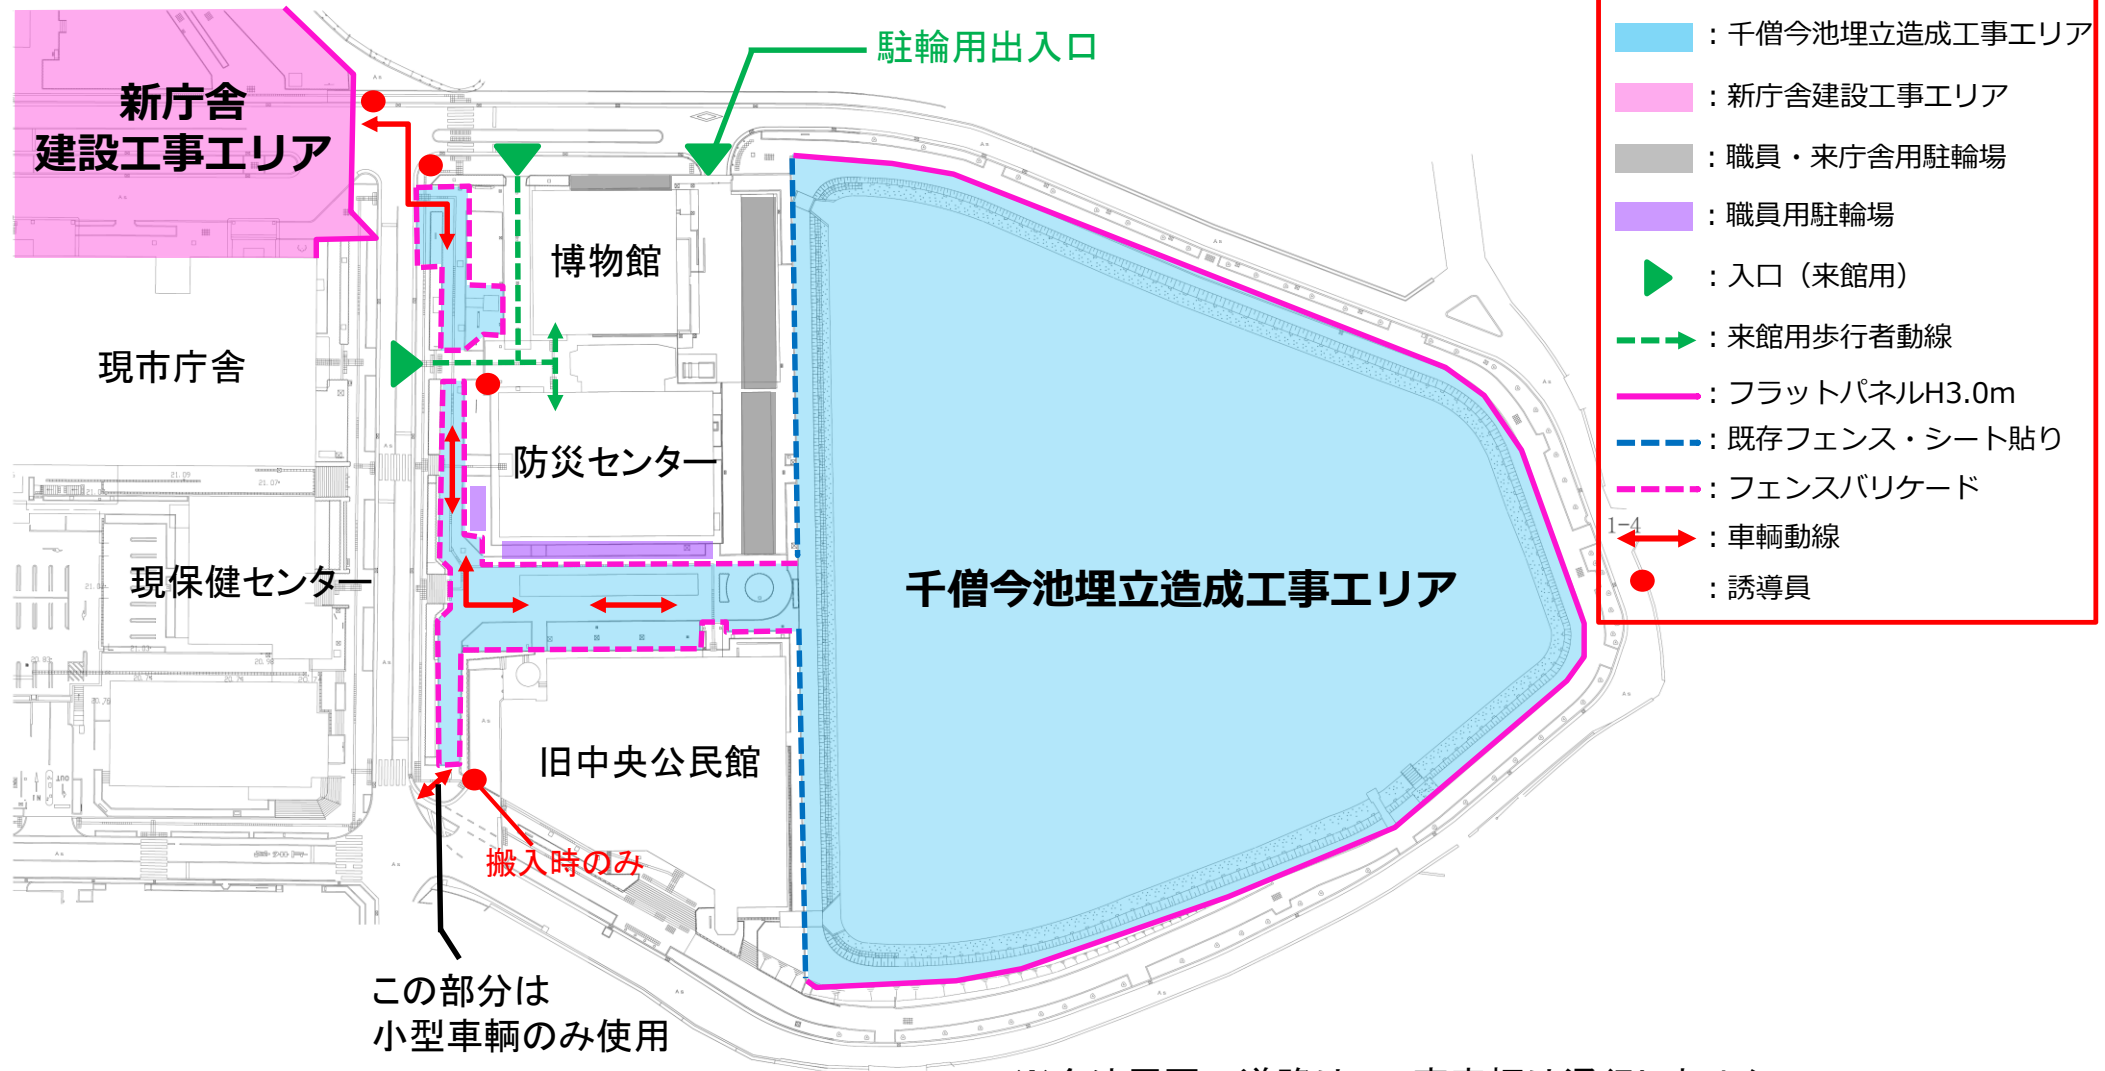

※今池周囲の道路は、工事車両は通行しません。  
 ただし、仮囲い組立・解体時は工事車両の通行が発生します。  
 また、仮囲い組立・解体時は歩行者の方にも迂回をお願いする  
 場合もあります。

### ■安全対策

- ・工事車輛の通行は右記ルートに限定します。
- ・ITCツールを活用して、搬出入車輛の時間調整を行うことにより、待機車輛を減らし、周辺道路における交通阻害要因を排除します。
- ・『工事車輛運行ルール』を策定し、工事関係者の新規入場時工事車輛運行ルールの教育を行うことにより、工事車輛運搬時の第三者の安全を確保します。
- ・今池の外周部道路には、車輛の通行は原則致しません。  
(ただし、仮囲い組立・解体時、道路横断等の工事を除きます。)
- ・西側からの博物館・防災センターへの来館者動線については、警備員を配置し誘導を行います。



### ■環境対策

- ・改良工事・埋戻し工事に使用するバックホウは超低騒音型建設機械を採用します。
- ・今池の外周部道路沿いの仮囲いには、工事中の粉塵の飛散を考慮し、3mのフラットパネルを設置します。
- ・埋戻し工事の際に粉塵の発生が考えられる場合は散水を行い、粉塵の発生を抑制します。
